Календарный план строительства

№ п/п	Наименование работ	Кол-во рабочих	Продолжит. работ, дн.
1	**Подготовительные работы :**		
1.1	Подготовка территории строительства , закуп и транспортировка оборудования и материалов, а также трубных секций, демонтаж и перенос существующего оборудования	6	36
2	**Земляные работы :**		
2.1	Рытье траншей для трубопроводов, котлованов; устройство обвалования одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3	2	42
2.2	Засыпка траншеи и котлованов бульдозерами 2 группы грунтов	2	40
2.3	Засыпка траншей вручную	1	40
3	**Монтажные работы :**		
3.1	Сварка труб и укладка в траншею . Установка фасонных частей (отводы, переходы, тройники,манжеты) Контроль сварных соединений газопровода физическим, радиографическим методом, внешним осмотром. Пневматическое испытание газопровода Продувка газопровода 2 раза	3	60
4	**Строительство:**		
4.1	Площадка котельной, резервуарного парка, насосной СУВГ, испарительной установкее, блок бокса СЛТМ, разработка грунта, устройство ограждения, устройство фундаментов и опор	3	48
4.2	Монтажные работы по котельной, резервуарам, насосной СУВГ, испарительной установки, монтаж и сварка оборудования, арматуры, трубопроводов, изоляционные работы, окраска, контроль стыков, врезка, испытание	3	48
5	**Инженерные сети:**		
5.1	Электроснабжение, молниезащита	2	16
5.2	Автоматизация технологических процессов	2	16
5.3	Электрохимзащита	2	16
6	**Пусконаладочные работы:**		
6.1	Пусконаладочные работы по котельной , резервуарам, насосной, испарительной установке , а также ввод в эксплуатацию объекти .	6	7

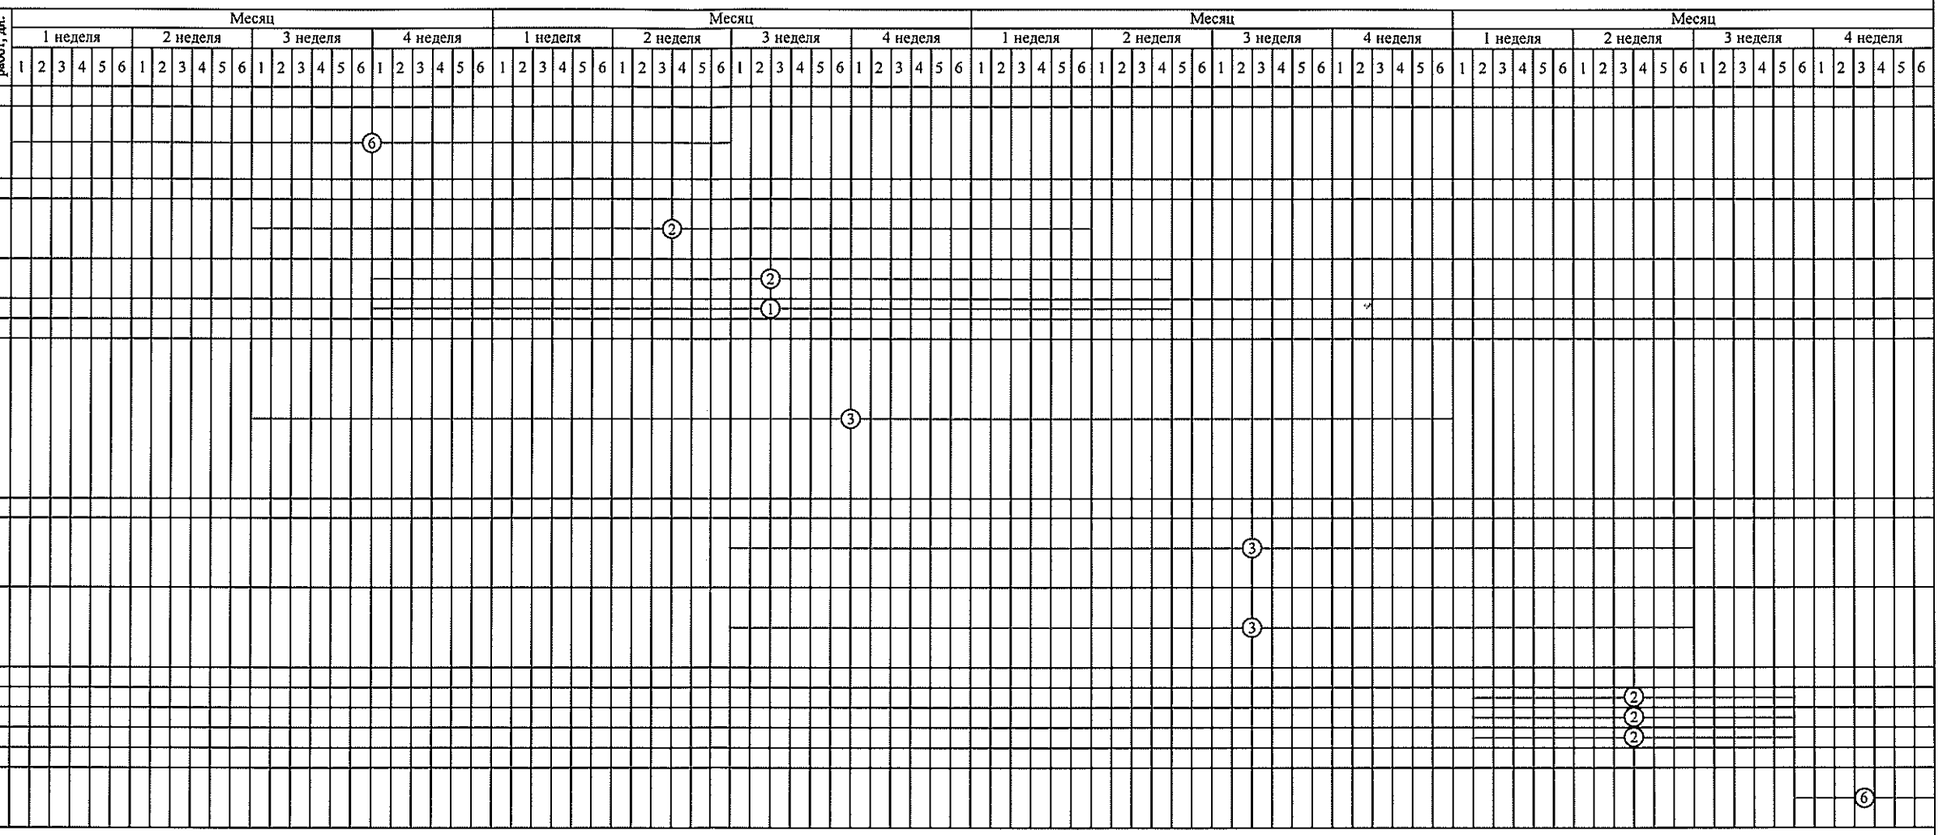

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл

Изм	Кол	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Шаянбаева			
Нач.отд.		Дереглазов			
Исполн.		Мамельбаев			
Н.контр.		Лим А.В.			

ДГ15-ДКС-024-742-ПОС

Строительство новой котельной для городского офиса ТОО "СП "Казгермунай" с использованием СУВГ (сжиженного углеводородного газа)"

Проект организации строительства	Стадия	Лист	Листов
	РП	-	

Календарный план строительства

КАТЭК
